PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

Vorgangsname	Dauer [Tag]	F-Beginn [Tag]	F-Ende [Tag]	Fort schritt [%]	Kosten	Umsatz	Stunden
Bauda	260	10.05.2009	07.05.2010				
Baust richtung	25	12.05.2009	05.06.2009				
[illegible]	14	12.05.2009	25.05.2009				
[illegible] esung	3	12.05.2009	14.05.2009				
[illegible] un aufstellen	10	20.05.2009	02.06.2009				
Baukontainer aufstellen	7	25.05.2009	02.06.2009				
Kran aufstellen	7	28.05.2009	05.06.2009				
Erdarbeiten	9	08.06.2009	16.06.2009				
Bohrpfähle	7	08.06.2009	16.06.2009				
Rohbau	135	18.06.2009	30.10.2009				
Erdgeschoß	64	18.06.2009	20.08.2009				
Erdgeschoß Abschnitt 1	30	18.06.2009	29.07.2009				
Erdgeschoß Abschnitt 2	30	30.06.2009	10.08.2009				
Erdgeschoß Abschnitt 3	30	10.07.2009	20.08.2009				
Obergeschoß	63	25.07.2009	25.09.2009				
Obergeschoß Abschnitt 1	30	25.07.2009	23.08.2009				
Obergeschoß Abschnitt 2	30	05.08.2009	03.09.2009				
Obergeschoß Abschnitt 3	30	17.08.2009	25.09.2009				
Dach	72	20.08.2009	30.10.2009				
Dach Abschnitt 1	30	20.08.2009	18.09.2009				
Dach Abschnitt 2	30	01.09.2009	30.09.2009				
Dach Abschnitt 3	30	21.09.2009	30.10.2009				
Technik	118	30.07.2009	24.11.2009				
Strom	78	30.07.2009	15.10.2009				
Strom EG Abschnitt 1	20	30.07.2009	18.08.2009				
Strom EG Abschnitt 2	20	11.08.2009	30.08.2009				
Strom EG Abschnitt 3	20	21.08.2009	09.09.2009				
Strom OG Abschnitt 1	20	24.08.2009	12.09.2009				
Strom OG Abschnitt 2	20	04.09.2009	23.09.2009				
Strom OG Abschnitt 3	20	26.09.2009	15.10.2009				
Heizung	78	19.08.2009	04.11.2009				
Heizung EG Abschnitt 1	20	19.08.2009	07.09.2009				
Heizung EG Abschnitt 2	20	31.08.2009	19.09.2009				
Heizung EG Abschnitt 3	20	10.09.2009	29.09.2009				
Heizung OG Abschnitt 1	20	13.09.2009	02.10.2009				
Heizung OG Abschnitt 2	20	24.09.2009	13.10.2009				
Heizung OG Abschnitt 3	20	16.10.2009	04.11.2009				
Lüftung	78	08.09.2009	24.11.2009				
Lüftung EG Abschnitt 1	20	08.09.2009	27.09.2009				
Lüftung EG Abschnitt 2	20	20.09.2009	09.10.2009				
Lüftung EG Abschnitt 3	20	30.09.2009	19.10.2009				
Lüftung OG Abschnitt 1	20	03.10.2009	22.10.2009				
Lüftung OG Abschnitt 2	20	14.10.2009	02.11.2009				
Lüftung OG Abschnitt 3	20	05.11.2009	24.11.2009				
Sonstiges	51	10.09.2009	30.10.2009				
Sonstiges EG	20	10.09.2009	29.09.2009				
Sonstiges OG	20	05.10.2009	30.10.2009				
Ausbau	184	21.09.2009	23.03.2010				
Fassade	61	21.09.2009	20.11.2009				
Fassade Abschnitt 1	15	21.09.2009	09.10.2009				
Fassade Abschnitt 2	15	31.09.2009	21.10.2009				
Fassade Abschnitt 3	15	02.11.2009	20.11.2009				
Innenausbau	94	28.09.2009	30.12.2009				
Innenausbau EG Abschnitt 1	35	28.09.2009	13.11.2009				
Innenausbau EG Abschnitt 2	35	12.10.2009	27.11.2009				
Innenausbau EG Abschnitt 3	35	20.10.2009	07.12.2009				
Innenausbau OG Abschnitt 1	35	23.10.2009	10.12.2009				
Innenausbau OG Abschnitt 2	35	03.11.2009	21.12.2009				
Innenausbau OG Abschnitt 3	35	26.11.2009	30.12.2009				
Installation	75	14.11.2009	27.01.2010				
Installation Beleuchtung EG Ab	20	14.11.2009	03.12.2009				
Installation Beleuchtung EG Abschni	20	30.11.2009	25.12.2009				
Installation Beleuchtung EG Abschni	20	08.12.2009	04.01.2010				
Installation Beleuchtung OG Abschni	20	11.12.2009	07.01.2010				
Installation Beleuchtung OG Abschni	20	22.12.2009	18.01.2010				
Installation Beleuchtung OG Abschni	20	31.12.2009	27.01.2010				
Einrichtung	40	27.01.2010	23.03.2010				
Außenanlage	138	23.11.2009	09.04.2010				
Planum herstellen	20	23.11.2009	18.12.2009				
Wiederherstellen der Grünflächen	80	21.12.2009	09.04.2010				
Wege herstellen	30	05.01.2010	15.02.2010				
Kran abmontieren	7	23.11.2009	01.12.2009				
Bauzaun abmontieren	10	01.02.2010	12.02.2010				
Baukontainer abtransportieren	3	01.02.2010	03.02.2010				
Pufferzone	20	09.04.2010	06.05.2010				
Übergabe	1	07.05.2010	07.05.2010				

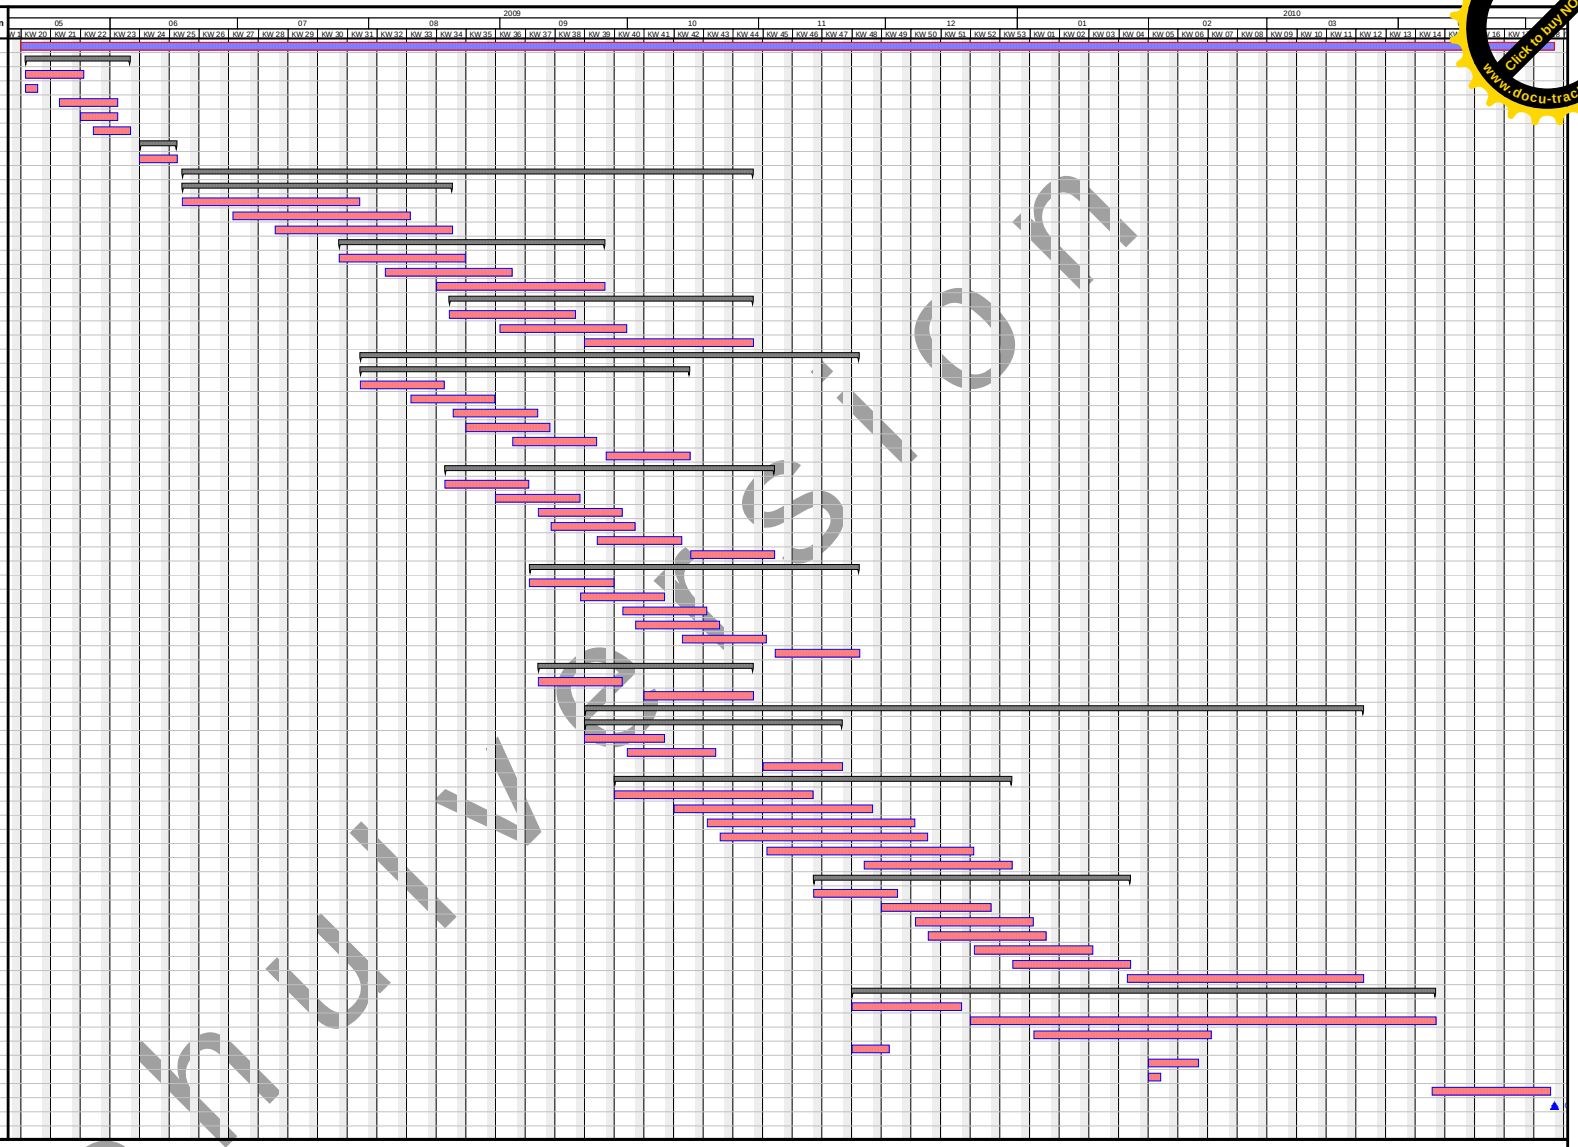

Projekt : Projekt von neu angelegt

Plannummer: Plandatum

Vorgang | Fortschritt | Sammelvorgang | Meilenstein | Unterbrechung

Gedruckt mit AUER Success 5.00 - Lizenz

Schutzgebühr
